



**Kommunaler Immobilien Service (KIS)**  
**Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

# **Fortschrittsbericht Baumaßnahmen an Schulen und Sportstätten**

Stand: Oktober 2019

---



# Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

## Friedrich-Wilhelm-v.-Steuben Gesamtschule (46)

Brandschutz- und Gebäudesanierung, Errichtung Containeranlage

### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Brandsch.	100	100	100	100	55	40	40	20
Container	50	50	0	0	5	5	5	10


### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Brandschutz	Jul. 19	Dez. 21	in Nutzung
Container	Jun. 20	Dez. 20	offen

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung



© potsdam-abc.de

## Grundschule Am Kirchsteigfeld (56)

Brandschutzsanierung



### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	98

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juni 18	Dez. 19	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung





# Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

## Schulstandort Gagarinstraße (GES29)

Gesamtschule mit Primarstufe und Hort und Errichtung 4-Feld-Sporthalle

### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Schule	100	100	100	100	97	80	80	77


### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Schule	Okt. 16	Jun. 20	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung





# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

## Grundschule Bornim

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	98

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Jul. 19	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Bis November Fertigstellung der Außenanlagen.





# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Grundschule Bornstedter Feld

Neubau 3-zügige Grundschule mit Hort und Turnhalle

#### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Schule	100	100	100	100	100	100	100	92


#### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Schule	Okt. 17	Dez. 19	Winterferien 20

#### Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Schule		

#### Bemerkung





## Turnhalle & Außensportanlage Gym. Haeckelstraße (5)

Neubau Turnhalle und Kleinspielfeld, Außensportanlagen


### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Turnhalle	100	100	100	100	100	90	90	70
Sportanl.	100	100	100	100	100	100	100	0

### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Turnhalle	Aug. 18	Jan. 20	Feb. 20
Sportanlage	Frühjahr 19	Jun. 20	Aug. 20

### Bemerkung



### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit





## Sportplatz Golm – Kuhforter Damm

Neubau Kunstrasenplatz als Ersatzbelag für Naturrasenplatz

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	100

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juni 19	Aug. 19	Aug. 19

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Platz ist in Nutzung,  
Restleistungen sind erfolgt.





## Sportplatz Lerchensteig

Neubau Sportanlage

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	80	50	80	20	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
offen	offen	offen

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

1. Nachfinanzierung für 2019 durch STVV beschlossen.  
Baugenehmigung liegt noch nicht vor.  
Höhe der 2. Nachfinanzierung wird aktuell ermittelt



## Grundschule Fahrland

Erweiterung Bestandsgebäude und Errichtung Containeranlage

### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Erweiterung	100	100	100	100	90	85	85	10
Container	100	100	100	100	100	100	100	50

### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Erweiterung	März 19	Sommer 20	SJ 20/21
Container	Jul. 19	Ende 19	Winterferien 20

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Rohbauelemente befinden sich in der Fertigung.

Containeranlage ist aufgestellt und Ausbau wurde begonnen.



## Grundschule Gutenbergstraße 67

Sanierung Bestandsgebäude für Grundschule und Hort

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	30	0	0	0	0	0	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Frühjahr 2020		

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Der Standort soll als Filiale der Eisenhart-GS geführt werden.



## Turnhalle Kurfürstenstraße 49

Denkmalgerechte Sanierung

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	30	0	0	0	0	0	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung



## Comenius-Förderschule (53)

Erweiterungsbau und Brandschutzsanierung Bestandsgebäude

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	50	0	0	0	0	0	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
	Ende 21	Winterferien 22

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Nach Aktualisierung der Bedarfsplanung wurde Projekterweiterung zwischen KIS und FB 23 abgestimmt.



## Gesamtschule „Am Schloss“ (28) - Interimsstandort

Errichtung Containeranlage am Interimsstandort an der Esplanade 5

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	95	95	60

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Jul. 19	Jan. 20	n. Winterferien 20

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Aufstellung der Container ist erfolgt. Mit dem Innenausbau wurde begonnen.



## Sportforum Schlaatz

Neubau

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	0	0	0	0	0	0	0

### Zeitplan


Baubeginn	Bauende	Nutzung
Frühjahr 21	Sommer 2023	Sommer 23

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Teilnehmeraufruf für Architekturwettbewerb ist erfolgt.  
Wettbewerbsergebnisse werden im März 2020 vorliegen.

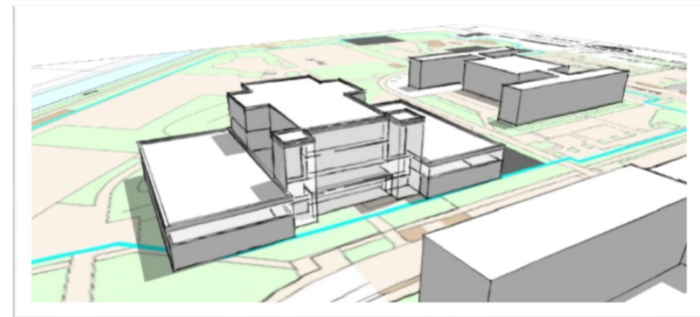



**Kommunaler Immobilien Service (KIS)**  
**Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

# **Fortschrittsbericht**

## **Baumaßnahmen an Kitas**

Stand: Oktober 2019

---





# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3

3. BA – Innensanierung Eingeschoss, Giebelseite links

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	80


#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Jun. 19	Nov. 19	Dez. 19

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung





## Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3

Neubau Modulanlage Kita



### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	99

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 19	Okt. 19	Nov. 19

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung



# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50

7. BA – Innensanierung Zweigeschosser Mitte

#### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
7. BA	100	100	100	100	95	95	95	70


#### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
7. BA	Mai 19	Dez. 19	Dez. 19

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung



### Kita Sausewind, Lotte-Pulewka-Straße 5-7

- 1. und 2. BA – Hüllensanierung und Anbau Mehrzweckraum,
- 3. BA – Innensanierung Ein-/ Zweigeschosser rechts inkl. Außenanlagen



#### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
1. + 2. BA	100	100	100	100	100	100	100	99
3. BA	100	100	100	100	100	100	100	70

#### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
1. + 2. BA	Mai 18	Dez. 19	Okt. 19 Neubau MZR
3. BA	Jan. 19	Dez. 19	Dez. 19

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

#### Bemerkung

3. BA – Eingeschosser: Nutzung ab September





# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Sausewind, Lotte-Pulewka-Straße 5-7

Neubau Modulanlage Hort

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	95	100	100	80


#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Jan. 19	Dez. 19	Feb. 20

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung





# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Burgstraße 23

Neubau

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	95	95	78


#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 18	Jan. 20	Feb. 20

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung





# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Gartenstraße OT Fahrland

Neubau in Modulbauweise

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	98


#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Jan. 19	Okt. 19	Dez. 19

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung





**Niederschrift  
Konstituierende öffentliche /nicht öffentliche Sitzung des Werksausschusses  
des Kommunalen Immobilien Service (KIS)**

---

<b>Sitzungstermin:</b>	24.10.2019
<b>Sitzungsbeginn:</b>	17:30 Uhr
<b>Sitzungsende:</b>	19.45 Uhr
<b>Ort, Raum:</b>	<b>Stadthaus, Raum 0.090</b>

---

Anwesend sind:

Ausschussmitglieder:

Herr Dr. Scharfenberg, Hans-Jürgen	DIE.LINKE
Herr Wollenberg, Stefan	DIE.LINKE (bis 18:33 Uhr)
Frau Reimers, Babette	SPD (bis 18:20 Uhr)
Frau Schkölziger, Grit	SPD
Herr Dr. Niekisch, Wieland	CDU
Herr Dörschel, Jens	Bündnis 90/Die Grünen
Herr Pfrogner, Steffen	die aNDERE
Herr Dienst, Ernst	sachkundiger Einwohner
Herr Adler, Jan	Beschäftigtenvertreter KIS
Frau Tefs, Anja	Beschäftigtenvertreter KIS

Werkleitung:

Frau Hoppe, Silke	Protokollantin
Herr Richter, Bernd	Werkleiter
Herr Wapenhans, Hansjörg	Stellvertretender Werkleiter/ Kaufmännischer Leiter

Gäste:

Frau Hesse, Petra	KIS 2, komm. Bereichsleiterin
Herr Dudzak, Maik	KIS 1, SB Controlling
Herr Etlich, Karsten	Kreiselterrat
Frau Eifrig, Antje	Kreiselterrat

nicht anwesend sind:

Herr Tänzer, Matthias	AfD (entschuldigt)
Herr Exner, Burkhard	Beigeordneter GB 1 (entschuldigt)
Herr Dr. Ruppert, Wilfried	sachkundiger Einwohner (entschuldigt)
Frau Sömmer, Martina	Bereich Beteiligungsmanagement (entschuldigt)



**Niederschrift konstituierende Öffentliche/ nicht öffentliche Sitzung des  
Werksausschusses des Kommunalen Immobilien Service (KIS) am 24.10.2019**

**Öffentlicher Teil:**

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsgemäßen Ladung / Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 23.05.2019/ Feststellung der öffentlichen Tagesordnung
3. Wahl der/des Ausschussvorsitzenden
4. Wahl der /des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden
- 5 Vorstellung des Kommunalen Immobilien Services
- 6 Überweisungen aus der Stadtverordnetenversammlung
  - 6.1 DS 19/SVV/0644 „Erweiterung des Schulcampus der Gerhart-Hauptmann-Grundschule 12“
  - 6.2 DS 19/SVV/0648 „Ausbau und Nutzung der Fläche am Kuhforter Damm für den Breitensport“
  - 6.3 DS19/SVV/0731 „Öffnung von Schulsportanlagen für unorganisierten Breitensport“
  - 6.4 DS 19/SVV/0892 „Defibrillatoren und Ersthilfekurse in öffentlichen Einrichtungen“
  - 6.5 DS 19/SVV/0894 „Nutzungspotentiale der Bestandssportflächen im Stadtgebiet“
  - 6.6 DS 19/SVV/0911 „Sportangebot im Potsdamer Norden/Zukunft des Tennisclubs Obelisk e.V.“
  - 6.7 DS 19/SVV/0921 „Sitzungskalender 2020“
7. Sonstiges

**Nichtöffentlicher Teil:**

8. Feststellung der nicht öffentlichen Tagesordnung / Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschriften des nicht öffentlichen Teils der Sitzungen vom 23.05.2019
9. Sonstiges

## Protokoll

### Öffentlicher Teil

#### 1. Eröffnung

Herr Dr. Scharfenberg übernimmt die Sitzungsleitung und begrüßt die Ausschussmitglieder und Gäste.

#### 2. Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsgemäßen Ladung / Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 18.01.2019 / Feststellung der öffentlichen Tagesordnung

Die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit werden festgestellt. Zu Beginn der Sitzung sind 10 Ausschussmitglieder anwesend. Aufgrund der Neubesetzung des Werksausschusses wird die Niederschrift nicht abgestimmt.

Herr Dr. Scharfenberg lässt somit über die öffentliche Tagesordnung abstimmen:

Abstimmungsergebnis:

<b>Zustimmung:</b>	<b>10</b>
<b>Ablehnung:</b>	<b>0</b>
<b>Enthaltungen:</b>	<b>0</b>

#### 3. Wahl der/des Ausschussvorsitzenden

Frau Grit Schkölziger wird einstimmig zur Ausschussvorsitzenden gewählt. Sie nimmt die Wahl an.

#### 4. Wahl der /des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden

Herr Dr. Scharfenberg wird als stellvertretender Ausschussvorsitzender einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an.

#### 5. Vorstellung des Kommunalen Immobilien Services

Herr Richter stellt den KIS anhand einer Präsentation, die mit der Niederschrift an alle Ausschussmitglieder versendet wird, vor.

Herr Dr. Scharfenberg bittet den KIS in jeder zweiten Ausschusssitzung um Kurzberichterstattung zum Personalstand.

Frau Schkölziger befragt die Ausschussmitglieder, ob es Einwände gäbe, den Vertretern des Kreiselterrates jederzeit Rederecht einzuräumen. Alle Ausschussmitglieder stimmen dem zu. Die anwesenden Vertreter des Kreiselterrates erhalten während der Sitzung freies Rederecht.

## 6. Überweisungen aus der Stadtverordnetenversammlung

### 6.1 DS 19/SVV/0644 „Erweiterung des Schulcampus der Gerhart-Hauptmann-Grundschule 12“

Herr Dr. Niekisch bringt den Prüfauftrag ein:

Nach kurzer Diskussion lässt Frau Schkölziger über die aus dem Ausschuss für Bildung und Sport geänderte Fassung abstimmen

„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen ob für die Erweiterung des Schulcampus der Gerhart-Hauptmann-Grundschule entsprechende Bedarfe im Sozialraum bestehen.“

#### **Abstimmungsergebnis:**

**Zustimmung: 8**

**Ablehnung: 0**

**Enthaltungen: 0**

Die Ausschussmitglieder bitten um Wiederbefassung in der nächsten Werksausschusssitzung im nichtöffentlichen Teil.

### 6.2 DS 19/SVV/0648 „Ausbau und Nutzung der Fläche am Kuhforter Damm für den Breitensport“

Herr Richter informiert, dass sich die entsprechende Vorlage der Verwaltung zur Änderung der Prioritätenliste der Bauleitplanung derzeit im Geschäftsgang befindet und empfiehlt, analog dem Ausschuss für Bildung und Sport zu verfahren und die Vorlage zurückzustellen.

Die Vorlage wird einstimmig zurückgestellt.

### 6.3 DS19/SVV/0731 „Öffnung von Schulsportanlagen für unorganisierten Breitensport“

Nach kurzer Diskussion über die Überschneidung des Antrages mit den von der Verwaltung geplanten Aktivitäten zur Umsetzung des Aktionsplanes kinderfreundliche Kommune, stellt der Antragsteller die Vorlage vorläufig zurück.

### 6.4 DS 19/SVV/0892 „Defibrillatoren und Ersthilfekurse in öffentlichen Einrichtungen“

Herr Richter informiert, dass die Entscheidung über den Umfang der Installation von Defibrillatoren durch die LHP zu treffen ist. Der KIS wird diese dann entsprechend umsetzen. Er weist weiterhin darauf hin, dass die Geräte herstellenseitig grundsätzlich missbrauchssicher ausgerüstet sind und i.d.R. durch jeden Ersthelfer bedient werden können.

Frau Schkölziger lässt abstimmen:

#### **Abstimmungsergebnis:**

**Zustimmung: 8**

**Ablehnung: 0**

**Enthaltungen: 0**

## **6.5 DS 19/SVV/0894 „Nutzungspotentiale der Bestandssportflächen im Stadtgebiet“**

Der Werksausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

## **6.6 DS 19/SVV/0911 „Sportangebot im Potsdamer Norden/Zukunft des Tennisclubs Obelisk e.V.“**

Frau Schkölziger lässt abstimmen:

### **Abstimmungsergebnis:**

**Zustimmung: 8**  
**Ablehnung: 0**  
**Enthaltungen: 0**

## **6.7 DS 19/SVV/0921 „Sitzungskalender 2020“**

**Der Werksausschuss bitte um Änderungen und Aufnahme folgender Termine für den Werksausschuss:**

1. Sitzung 06.12.2019 um 15:00 Uhr
2. Sitzung 13.02.2020 um 17:30 Uhr
3. Sitzung 24.04. 2020 um 15:00 Uhr
4. Sitzung 11.06.2020 um 17:30 Uhr
5. Sitzung 28.08.2020 um 15:00 Uhr
6. Sitzung 09.10.2020 um 15:00 Uhr
7. Sitzung 11.12.2020 um 15:00 Uhr.

**Frau Schkölziger lässt hierüber mit einstimmigen Ergebnis abstimmen:**

## **7. Sonstiges**

Herr Richter befragt die Ausschussmitglieder, ob diese den aktuellen Bericht des KIS über die Umsetzung des Schul- und Kita Sanierungsprogramms bis 2019 wünschen, der auch schon im Ausschuss für Bildung und Sport vorgestellt wurde. In Anbetracht der Zeit wird darauf verzichtet. Die Präsentation wird allen Ausschussmitgliedern mit der Niederschrift übersandt.

Frau Eifrig vom Kreiselternrat fragt nach, wie der KIS mit unplanmäßigen baulichen Mängeln umgeht. Herr Richter fragt nach, ob hier die Sperrung der Turnhalle am Schilfhof angefragt wird. Frau Eifrig bejaht dies.

Herr Richter berichtet, dass der KIS zwei mögliche Varianten zur Gewährleistung des Turnhallenbetriebs prüft. Eine Option ist die schnellstmögliche Teilsanierung der Bestandshalle (Dachabdichtung, Sportboden, Prallwand, Malerarbeiten). Alternativ wird die Aufstellung einer Fertigteilhalle auf den vorhandenen Außenspielflächen geprüft. Auf der Grundlage der Prüfergebnisse wird dann entschieden, welche Variante schnellstmöglich umgesetzt wird. Hierbei gelten zwei Zielvorgaben. Der Sporthallenbetrieb muss möglichst zum neuen Schuljahr, spätestens jedoch Ende Herbst 2020 wieder gewährleistet werden und einen gesicherten Betrieb bis zur Errichtung des geplanten Sportforums ermöglichen.

- Ende öffentlicher Teil-

  
Schkölziger  
Werksausschussvorsitzende

  
Hoppe  
Protokollantin
