

Schulwegsicherung - Maßnahmen 2015



Landeshauptstadt
Potsdam

Schule	Maßnahme	Kosten
Eisenhart-Schule	LSA Hebbelstraße	7.323,47 €
Evangelische Grundschule Potsdam	Große Weinmeisterstr. Einbau Verkehrswächter	3.950,80 €
Grundschule Bornim	Umsetzung Lichtsignalanlage Potsdamer Straße	30.412,65 €
Karl-Foerster-Schule	Verkehrswächter in der Kirschallee	15.017,78 €
Freie Walddorfschule	Verkehrswächter in der E.-Weinert-Straße	
Förderschule Wilhelm von Türk	Poller im Bisamkiez in der Zufahrt zur Schule	
Grundschule Hanna von Pestalozza	Querungsmöglichkeit / Vorstreckung Christophorusweg/Hechtsprung Groß Glienicke	3.496,90

Summe: 60.201,60 Euro

Schulwegsicherung – geplante Maßnahmen 2016



Schule	Maßnahme	Kosten
Grundschule im Bornstedter Feld und Innenstadt Schulen	Umgestaltung des Knotenpunktes 160 Voltaireweg/ Schlegelstraße	anteiligen Baukosten ca. 23.000 €
Regenbogenschule Fahrland	Schaffung einer Elternvorfahrt im Bereich der Haltestelle bzw. Verbesserung Hol- und Bringeverkehr	ca. 20.000 €
Grundschule am Griebnitzsee	Maßnahmen in Verbindung mit dem Radverkehrskonzept z.B. Querungshilfe (August-Bebel-Straße)	ca. 7.000 €
Grundschule Bornim	Maßnahmen zur Verbesserung der Knotenpunktgeometrie und Fortführung/Vervollständigung der Gehweganlage (ggü. Kita) in der Mitschurinstraße	

Summe: ca. 50.000 Euro



Fortschrittsbericht Schulbaumaßnahmen KIS

Stand: März 2016

Humboldt-Gymnasium (1)

Sanierung, Erweiterung und Neugestaltung Außen- und Sportanlagen

Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Neubau	100	100	100	100	100	100	100	100
Altbau	100	100	100	100	100	75	75	25


Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Neubau	Okt. 13	Jul. 15	Schuljahr 15/16
Altbau	Sept. 15	Aug. 16	Sept. 16

Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Neubau	●	●
Altbau	●	●

Bemerkung



Helmholtz-Gymnasium (4)

Sanierung und Erweiterung


Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	85

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Jul. 13	Aug. 16	Sept. 16

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Eisenhart-Grundschule (24)

Sanierung Filiale

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	99

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Aug. 14	Aug. 15	01.09.2016

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

Rückzug Eisenhart-Grundschule und Hort in Sommerferien 2016



Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)

Außenanlagen (2. BA)



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	25

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Nov. 15	Mai 16	01.06.2016

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Nutzungsaufnahme Mensa + Hort zum Schulstart 15/16 erfolgt - nun erfolgt die Sanierung der Außenanlagen im 2. BA.



Standort Goetheschule (21/31)

Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Goethe- & Beethovenhaus	100	100	100	100	100	100	100	100
Aula	100	100	90	0	0	0	0	0

Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Goethe- & Beethovenhaus	Jun. 13	Jul. 15	in Nutzung
Aula	Jul. 16	Dez. 16	Jan. 17

Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Goethe- & Beethovenhaus	●	●
Aula	●	●

Bemerkung



Zeppelin-Grundschule (23)

Ausbau Untergeschoss



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	90	80	60	1

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 16	Sept. 16	in Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Friedrich-Wilhelm-v.-Steuben Gesamtschule (46)

Brandschutzsanierung



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	10	0	0	0	0	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Aug. 16	Dez. 16	in Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung



Grundschule Am Kirchsteigfeld (56)

Brandschutzsanierung

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	10	0	0	0	0	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Aug. 16	Dez. 16	in Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung



Gesamtschule Leonardo da Vinci (32)

Neubau Gesamtschule im Potsdamer Norden

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	98	97	97	65


Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Nov. 14	Aug. 16	Schuljahr 16/17

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung



Schulstandort Gagarinstraße (GES39 und GS14)

Gesamtschule und Errichtung 4-Feld-Sporthalle + Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	97	0	0	0	0	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Sept. 16	Jun. 18	Schuljahr 18/19

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung



Grundschule Bornim

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	95	0	0	0	0	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Sept. 16	Jun. 18	Schuljahr 18/19

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung



Grundschule Bornstedter Feld

Neubau 3-zügige Grundschule mit Hort und Turnhalle

Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Schule	60	0	0	0	0	0	0	0

Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Schule	2017	2019/2020	2019/2020

Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Schule		

Bemerkung

Bekanntmachung Architekturwettbewerb ist erfolgt.

Turnhalle Kurfürstenstraße

Neubau



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	90	90	60

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 15	Herbst 2016	Herbst 2016

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Dachelemente Halle wurden verlegt.



Turnhalle Leibniz-Gymnasium (41)

Sanierung und Erweiterung

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	90	50	25	0	0



Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 16	Aug. 17	Aug. 17

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

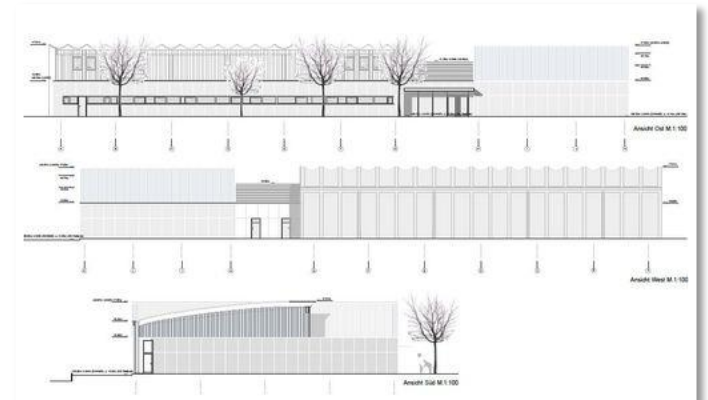

Turnhalle Ludwig-Renn-Grundschule (2)

Neubau


Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	0	0	0	0	0	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Frühjahr 18	Frühjahr 18

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Motorsporthalle (21)

Sanierung



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	80	50	3	0	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mai 16	Herbst 18	in Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Schulsport wird gewährleistet, temporäre Einschränkungen.

Sporthalle Heinrich-Mann-Allee

Brandschutzsanierung

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	70	0	0	0	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
offen	offen	in Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

Projekt wurde vorläufig bis zur Entscheidung über Grundschulstandort zurückgestellt.



Schilfhofschule (49)

Sanierung und Erweiterung



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	90	40	20	5	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 16	Jul. 17	Schuljahr 17/18

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

