



**Kommunaler Immobilien Service (KIS)**  
**Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

# **Fortschrittsbericht**

# **Baumaßnahmen an Schulen**

Stand: Februar 2017

---



## Humboldt-Gymnasium (1)

Sanierung, Erweiterung und Neugestaltung Außen- und Sportanlagen

### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Neubau	100	100	100	100	100	100	100	100
Altbau	100	100	100	100	100	100	100	91


### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Neubau	Okt. 13	Jul. 15	Schuljahr 15/16
Altbau	Sept. 15	Mrz. 17	Apr. 17

### Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Neubau	●	●
Altbau	●	●

### Bemerkung



### Standort Goetheschule (21/31)

#### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Goethe- & Beethovenhaus	100	100	100	100	100	100	100	100
Aula	100	100	100	100	100	100	95	30

#### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Goethe- & Beethovenhaus	Jun. 13	Jul. 15	in Nutzung
Aula	Okt. 16	Mai 17	Jun. 17

#### Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Goethe- & Beethovenhaus	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>
Aula	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>

#### Bemerkung





# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Gesamtschule Leonardo da Vinci (32)

Neubau Gesamtschule im Potsdamer Norden

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	98	97	97	77


#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Nov. 14	Aug. 17	Schuljahr 17/18

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung





## Schulstandort Gagarinstraße (GES29)

Gesamtschule mit Primarstufe und Hort und Errichtung 4-Feld-Sporthalle

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	70	40	20	5

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Okt. 16	Feb. 19	Mrz. 19

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Teilfertigstellung Neubau in Februar 2019.  
Altbau Fertigstellung in Juni 2020.



## Grundschule Bornim

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	80	60	30	2	2

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Ende 18	Winterferien 19

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung

Teilbaugenehmigung für Baufeldfreimachung und Baugrundverbesserung am 03.01.2017 erteilt.

Vergabe Rohbau erst nach Ges.-Baugenehmigung. Nachfolgend Aktualisierung Bauablaufplanung.





# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Grundschule Bornstedter Feld

Neubau 3-zügige Grundschule mit Hort und Turnhalle

#### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Schule	100	80	10	0	0	0	0	0


#### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Schule	2017	Jul. 19	Schuljahr 19/20

#### Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Schule		

#### Bemerkung





# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Turnhalle Leibniz-Gymnasium (41)

Sanierung und Erweiterung

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	85



#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 16	Feb. 17	März 17

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung

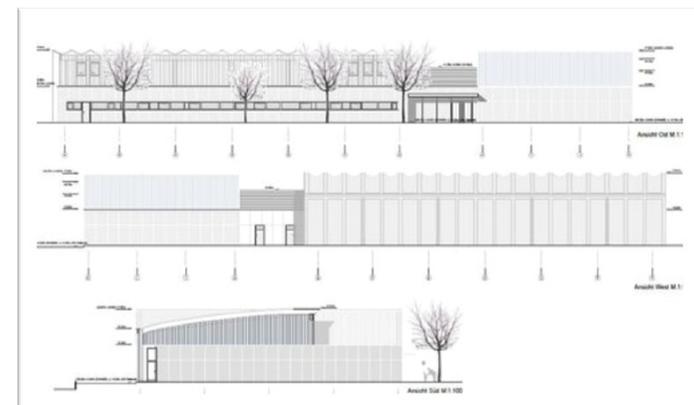

## Turnhalle Ludwig-Renn-Grundschule (2)

Neubau

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	80	50	15	10	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Frühjahr 18	Frühjahr 18


### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
●	●

### Bemerkung

Abriss der alten TH und Herstellung Außenanlage bis Ende 2018.

Nachbarschaftsrechtliche Risiken im Genehmigungsverfahren.

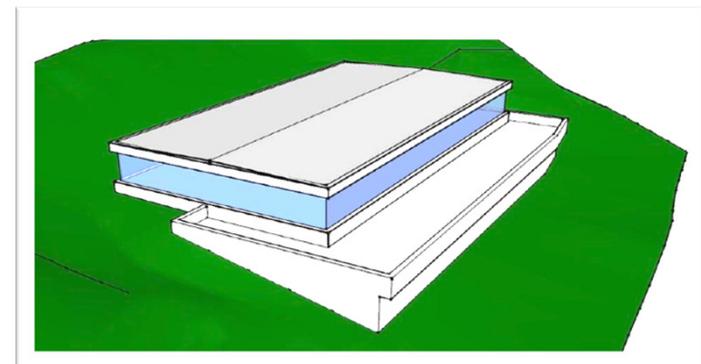

## Motorsporthalle (21)

Sanierung

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	95	80	45	35	10

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mai 16	Dez. 18	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
●	●

### Bemerkung

Schulsport wird gewährleistet, temporäre Einschränkungen.



## Schilfhofschule (49)

Sanierung und Erweiterung

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	75	40	25	15

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 16	In Abstimmung	In Abstimmung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung

Aufgrund der vom Nutzer und FB21 gewünschten Änderungen im Bereich der Speiserversorgung kommt es zu einer Verschiebung in der Fertigstellung. Diese befindet sich noch in der Detailabstimmung.



### Temp. Schule in Modulbauweise Humboldttring (37)

Neubau

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	95	65	70	55	0

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Aug. 16	vor. Dez. 17	

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

#### Bemerkung

Kampfmitteluntersuchung Bohrarbeiten sind abgeschlossen, z. Z. noch begleitende Tätigkeit bei den Umverlegearbeiten der EWP.

Mitteilung der EWP: Fertigstellung Umverlegung Fernwärme Mai 2017





## Turnhalle Gymnasium Haeckelstraße (5)

Neubau

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
50	0	0	0	0	0	0	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Durchführung Auswahlverfahren für Planungsleistungen bis April 2017

# Volkshochschule im Bildungsforum

**Eine Jahresbilanz**

**Dr. Myrtan Xhyra**

Direktor

## Bildung verbindet Menschen

- Programmvielfalt
- lebenslanges Lernen
- passgenaue Angebotsorientierung
- offen und integrativ





**VHS**

**VOLKSHOCHSCHULE**  
IM BILDUNGSFORUM POTSDAM

# RÜCKBLICK

❖ Neustrukturierung der Öffentlichkeitsarbeit



# NEUE KOOPERATIONSPARTNER



Oberlin-  
Werkstätten



Qualifizierung in  
Kooperation mit  
der IHK für den  
Microsoft Office  
Bereich



Arbeit und Leben  
DGB,  
Berlin-  
Brandenburg

# NEUE KOOPERATIONSPARTNER



Fachstelle  
Arbeitsmarktpolitik  
und Beschäftigung-  
förderung



Gedenk- und  
Begegnungsstätte  
Leistikowstraße



Neue Wege der  
Zusammenarbeit  
mit SLB und WIS  
im Bildungforum

# INTEGRATION



## Berufsbezogene Deutschkurse B2

- Zugelassen vom BAMF
- Sprachliche Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt
- Zusammenarbeit mit Welcome Integration Network Service Center der IHK



## Förderprogramm „Integration durch Qualifikation (IQ)“

- Ausschreibung vom Brandenburgischer Volkshochschulverband e.V.
- Deutschkurse für Migranten mit reglementierten Berufen wie z.B. Mediziner oder Lehrer
- Vorbereitung auf die sprachlichen Zugangsprüfungen




## Weiterbildungspreis 2016 des Landes Brandenburg für das Projekt „Lernwerkstatt Deutsch“

- offenes kostenloses Angebot zum Deutschlernen
- Zusammenarbeit mit über 70 Ehrenamtlern
- Kooperation mit SLB und Grundbildungszentrum


## Statistische Zahlen

Taglich rund 550 Teilnehmende



## Statistische Zahlen

Zwei zusätzliche Personalstellen seit September 2016




## Statistische Zahlen

VHS als professioneller Bildungspartner für die LHP



## Einnahmen in TEURO



Durchschnittswerte der Teilnehmerentgelte der VHS in Brandenburg: 34 % (2015)



VHS

VOLKSHOCHSCHULE  
IM BILDUNGSFORUM POTSDAM

# AUSBLICK

## ❖ Neuer Internetauftritt



VHS

VOLKSHOCHSCHULE  
IM BILDUNGSFORUM POTSDAM

Kurs(e) im Warenkorb 1

Volltextsuche    
erweiterte Suche

Programm

Über uns

Service

Kontakt



Politik und Gesellschaft

Grundbildungszentrum

Kultur und Gestalten

Gesundheit

Sprachen

Beruf und Computer

Deutsch als Fremdsprache

Zertifikate

Lernwerkstatt

Bildungsfreistellung

Firmenschulung

VHS Förderverein

Kurstipps

Englisch für Wiedereinsteiger A1.2

Windows 10 für Umsteiger

Die Sehkraft aktivieren ein praktischer Workshop

Basteln für Kinder auf Italienisch

Chinesische Tuschemalerei und Kalligrafie Fortführungskurs

Neue Öffnungszeiten in der VHS in den Ferien

mehr lesen ...

Kurse für einfache Sprache

mehr lesen ...

Teilnehmer-Login

Anmelden

Sie haben Ihr Passwort vergessen?  
Sie möchten ein neues Login anfordern?

Neuigkeiten aus der vhs

Lesen und Schreiben in den AKTIVA-Werkstätten!



Am 13. Oktober haben Daniel Klappert, Geschäftsführer der AKTIVA Werkstätten im Oberlehnhaus gemeinnützige GmbH, und Dr. Myrta Xhyia, Direktor

mehr lesen ...

Grundbildungszentrum

Kurse für Jeden



Am 13. Oktober haben Daniel Klappert, Geschäftsführer der AKTIVA Werkstätten im Oberlehnhaus gemeinnützige GmbH, und Dr. Myrta Xhyia, Direktor

mehr lesen ...

Lernwerkstatt Aktuell

Weihnachtsfeier in der Lernwerkstatt



Am 13. Oktober haben Daniel Klappert, Geschäftsführer der AKTIVA Werkstätten im Oberlehnhaus gemeinnützige GmbH, und Dr. Myrta Xhyia, Direktor

mehr lesen ...

Veranstaltungskalender

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

< November 2016 >

Kontakt  
VHS Potsdam  
Am Kanal 47  
14467 Potsdam  
T: 0331 389-4546, -4549  
F: 0331 389-4575  
vhsinfo@karhu.vhs-potsdam.de

Öffnungszeiten  
Montag und Mittwoch  
19:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 15:00 Uhr  
Dienstag und Donnerstag  
12:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 18:00 Uhr  
Während der Schulferien  
nur bis 16:00 Uhr geöffnet

Anreise mit ÖPNV  
Haltestelle "Platz der Einheit/Bildungsforum"  
Tram Linie 95, Tram Linie 94  
Tram Linie 99, Bus 592  
Anreise mit dem Auto  
Über die A115: Ausfahrt Potsdam-Babelsberg  
Richtung Potsdam Zentrum, Haltestelle  
Berliner Straße, Am Kanal  
VHS Potsdam  
Am Kanal 47  
10600 Potsdam

Ansicht: A A A  
Kontrast   
Impressum  
AGB  
Sitemap

# Volkshochschule im Bildungsforum

## Ausblick

- **Qualitätstestierung (AZAV, zusammen mit der Fachstelle Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung)**
- **Gründung eines Fördervereins**
- **Vorbereitung auf 100 Jahre VHS Potsdam (2019)**
- **Fotoausstellung ab 1. September “VHS hat viele Gesichter”**

# Volkshochschule im Bildungsforum

## Ausblick

- Erasmus+
- Zulassungsantrag für Deutschkurse im Bereich akademische Heilberufe (Regelförderung Bund)
- Erhöhung der Dienstleistungsqualität (E-Payment und Sepa-Lastschrift)

# Volkshochschule im Bildungsforum

## Herausforderungen

- **Teilnehmerakquise in allen Stadtteilen, um bestimmte Zielgruppen besser zu erreichen (z.B. Bildungsbenachteiligte)**
- **Gewinnung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen**
- **bessere Wahrnehmung der Volkshochschule als professioneller Anbieter der beruflichen Bildung**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ausschuss für Bildung und Sport

über  
21, Frau Rademacher

**Sportstadtmittel 2017**  
**Mitteilung zur Vergabe im Haushaltsjahr 2017**

Gemäß Beschluss der Haushaltssatzung 2017 gem. DS 16/SVV/0801 vom 01.03.2017 sind im Jahr 2017 insgesamt 200.000 € für die Sportstadtmittel vorgesehen.

Hinsichtlich der Vergabe der Sportstadtmittel sind mit dem Ausschuss für Bildung und Sport nach der Umwandlung von Hauptstadtmitteln in Sportstadtmittel Kriterien verabredet, die sich an den Vergabemodalitäten hinsichtlich der ehemaligen Hauptstadtmittel und dem üblichen Abstimmungsverfahren mit dem Stadtsportbund und dem zuständigen Fachministerium orientieren – Anlage.

Hierzu ist die entsprechende Abstimmung mit dem Stadtsportbund Potsdam e. V. und dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erfolgt.

In der Anlage finden Sie einen entsprechenden Ergebnisvermerk.

Zur beigefügten Übersicht der geplanten Einzelmaßnahmen wird der Ausschuss für Bildung und Sport um Kenntnisnahme gebeten.



Torsten Gessner  
Bereichsleiter Sport

Anlagen  
Tabelle  
Kriterien

**Sportstadtmittel 2017 - Bereich Sport**

Stand: 03.03.2017

	2016 Förderung	Beantragte Förderung	2017 Förderung	Bemerkungen
Sportveranstaltungen				
Schlösserlauf	20.000	20.000	20.000	
Kanusprint	26.000	26.000	26.000	Antrag in Überarbeitung
Intern. Indoorturnier Fußball/w MBS Arena	30.000	30.000	30.000	Antrag in Überarbeitung
Potsdamer Drittelmarathon - rbb Lauf	13.000	13.000	13.000	
Stabhochsprungmeeting (SC Potsdam)	8.000	8.000	8.000	
2. Internationales Kugelstoßmeeting (SC Potsdam)		5.000	5.000	
Intern. Potsdamer Volleyball Masters (SC Potsdam)	7.000	5.000	0	Verschiebung in SFM
Deutsches Turnerfest (MTB)		5.000	5.000	
1. Bundesliga				
1. FFC Turbine Potsdam e. V.	25.000	25.000	25.000	
SC Potsdam e. V. - Volleyball	30.000	30.000	30.000	
Triathlon Potsdam e. V.	7.834	15.000	10.000	
UJKC Potsdam e. V.	10.000	10.000	10.000	
OSC Potsdam e. V. - Wasserball	15.000	15.000	15.000	
OSC Potsdam e.V. - Schwimmen	3.000	3.000	3.000	
SV Motor Babelsberg - Boxen				Verschiebung in SFM
Gesamt	194.834	210.000	200.000	

## **Anlage**

### **Kriterien / Abstimmungsverfahren für die Vergabe von Sportstadt- bzw. ehem. Hauptstadtmitteln**

- 1. Ausrichtung hochkarätiger, herausragender Sportveranstaltungen, die geeignet sind Potsdam in seiner Funktion als Landeshauptstadt Brandenburgs angemessen im In- und Ausland zu repräsentieren.**

Die überregionalen Veranstaltungen strahlen bzgl. ihrer Bedeutung und Teilnehmer sowie Besucher über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Somit übernimmt Potsdam in diesem Segment die Funktion einer Landeshauptstadt für Brandenburg und zeigt u. a. dessen Leistungsfähigkeit, Attraktivität und Offenheit.

Neu: Events in der MBS - Arena Luftschiffhafen

- 2. Unterstützung von Mannschaften in der 1. Liga / höchste Spielklasse auf Bundesebene in ausgewählten Kernsportarten und Sicherung des Verbleibs in der Liga**

Die Potsdamer Mannschaften in Deutschlands höchsten Spielklassen / bzw. 1. Ligen wirken bzgl. ihrer Bedeutung und Wahrnehmbarkeit weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus.

Effekte / Erwartungen u.a.:

Übernachtungen in Potsdamer Hotels, Präsentationen auf Messen

Viele Teilnehmer verbringen einen längeren Aufenthalt in Potsdam

Potsdam – Sportstadt / Stadtmarketing

- öffentliches Interesse, positive Berichterstattung in Medien

### **Mehrstufiges Abstimmungsverfahren**

- Entwurf der Verwaltung unter Berücksichtigung der Antragslage
- Abstimmung und Votum des SSB Potsdam und MBS
- Informationen und Diskussionen im Ausschuss für Bildung und Sport
