

Schule mit dem sonderpädagogischen  
Förderschwerpunkt Lernen  
Städtische Ganztagschule

**Schule am Nuthetal**



Schulporträt

*Die Schule  
am Nuthetal  
im Schuljahr  
2015/2016*

Schule mit dem sonderpädagogischen  
Förderschwerpunkt Lernen  
Städtische Ganztagschule

## Schule am Nuthetal

# Organigramm

### Schule am Nuthetal

An der Alten Zauche 2c  
14478 Potsdam

**Telefon:** 0331-289 8180

**Fax:** 0331-289 8181

**E-Mail:**

s401262@schulen.brandenburg.de

**Internet:**

www.schule-am-nuthetal-potsdam.de

**Schulleiterin** Frau Lehmann

☎ – 8183

**Stellv. Schulleiter** Herr Lehmann

☎ – 8186

**Sekretariat** Herr Steiner

☎ – 8180

**Schulsozial-  
arbeiterin**

Frau Treptow

☎ – 8190

**Kollegium Lehrerzimmer** ☎ – 8185

Frau Görner

Herr Güthler

Frau Hellrung

Frau Herrmann

Frau Hrabia

Frau Netzler

Herr Riemann

Frau Ring

Frau Unverzagt

Frau Vollandt-Andreas

Frau Weihrauch


**Hausmeister**

Herr Baierl

☎ – 8184

📞(0173)9692808

## Schule am Nuthetal

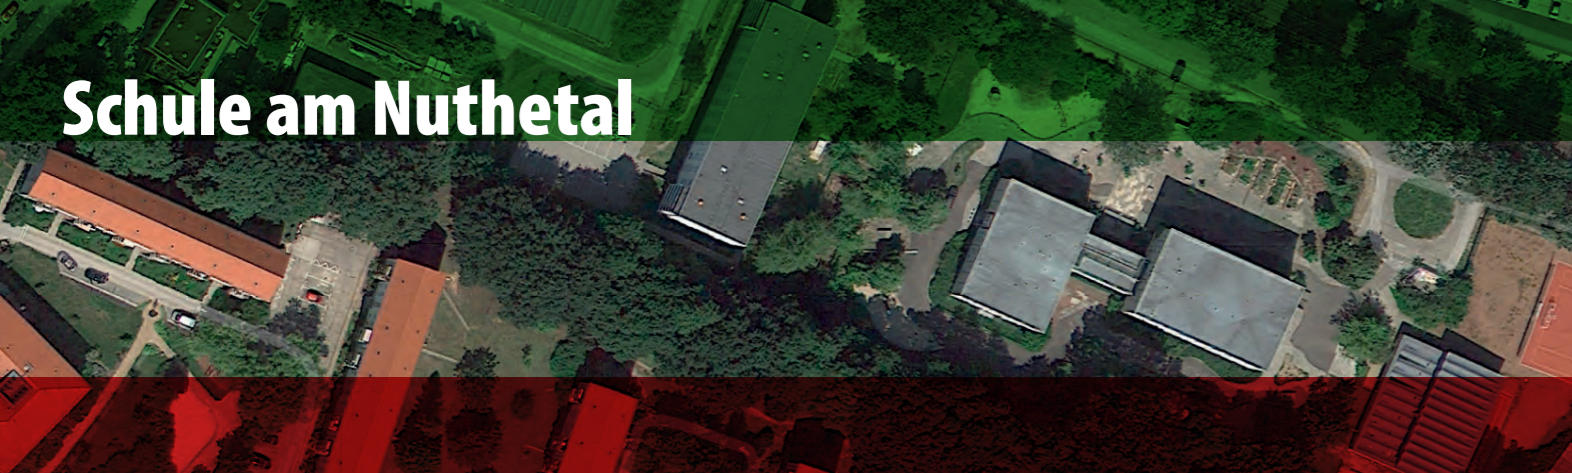

# Pädagogische Konzeption



## Schule am Nuthetal

# Jahrgangsübergreifende Bausteine der Berufsorientierung und -vorbereitung



Klassenstufe 7

Klassenstufe 8

Klassenstufe 9

Klassenstufe 10

### **Schulinterner Berufsinformationstag**

für Schüler, Eltern und Lehrer

in Zusammenarbeit mit allen Kooperationspartnern

### **Lern- und Kompetenztraining (LKT)**

klassenstufenübergreifend

### **Offenes Mittagsangebot im Ganztag (OMA)**

**Ganztagsangebote** im Vor- und Nachmittagsbereich

Arbeit im Berufswahlpass

Nutzung regionaler und überregionaler

Angebote zur Berufsorientierung

Tag des Hotel- und Gaststättengewerbes


Zukunftstag

Komm auf Tour

Azubi-Speed-Dating

Angebote der Agentur für Arbeit

# Schule am Nuthetal

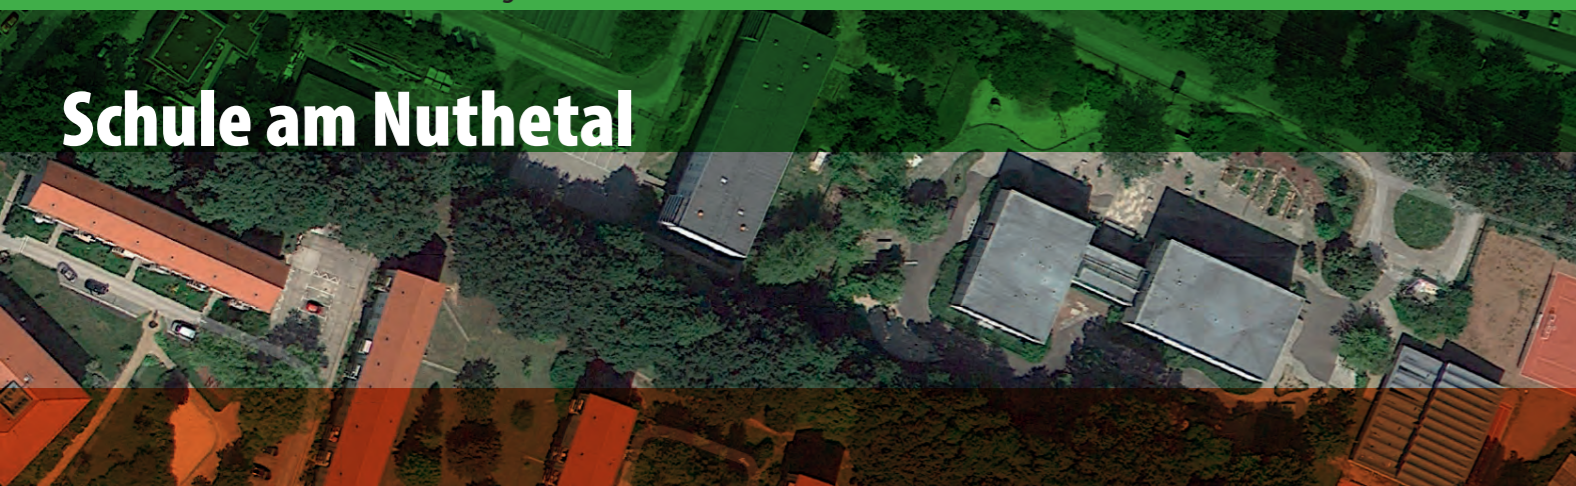

## Jahrgangsübergreifende Bausteine der Berufsorientierung und -vorbereitung



Klassenstufe 7	Klassenstufe 8	Klassenstufe 9	Klassenstufe 10		
Einführung Klassenrat	Praxislerntag Dienstag <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebserkundungen</li> <li>• Einführung Berufswahlpass</li> <li>• Besuch des BIZ</li> <li>• Arbeit im Berufsfeld Holz</li> </ul>	Praxislerntag Mittwoch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reiterhof</li> <li>• Schäferhof</li> <li>• Schule (Hauswirtschaft)</li> <li>• Kooperationspartner</li> </ul> SPSG <ul style="list-style-type: none"> <li>• OSZ Technik</li> </ul>	Praxislerntag Donnerstag <table border="1"> <tr> <td>In selbst- gewählten Betrieben</td> <td>Zusätz- licher Unterricht nach dem Rahmen- lehrplan der Sekun- darstufe</td> </tr> </table>	In selbst- gewählten Betrieben	Zusätz- licher Unterricht nach dem Rahmen- lehrplan der Sekun- darstufe
In selbst- gewählten Betrieben	Zusätz- licher Unterricht nach dem Rahmen- lehrplan der Sekun- darstufe				
TÜV-Rheinland Akademie <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Tage Potenzialanalyse</li> </ul>	TÜV-Rheinland Akademie <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Tage Erprobungsphase in 3 verschiedenen Berufsfeldern</li> </ul>	September 2 Wochen Schüler- betriebs- praktikum	Juni 2 Wochen Schüler- betriebs- praktikum	April 4 Wochen Schüler- betriebspraktikum	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop zur Vorbereitung des Schülerbetriebspraktikums</li> <li>• Vorbereitung der Bewerbungsunterlagen</li> </ul>	Büro Blau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anfertigen einer Internetpräsentation</li> </ul>	Büro Blau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begleitung des Praktikums</li> </ul>		
	Urania Schulhaus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewerbungstraining</li> </ul>	Urania Schulhaus zum Bewer- bungs- gespräch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewerbungsflyer</li> </ul>	AOK <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewerbungstraining Telefonleitfaden</li> </ul>		
			DGB-Jugend <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewerbungstraining</li> </ul>		
			Rückenwind e.V. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwälte in die Schule</li> <li>• Rechte und Pflichten als Azubi</li> </ul>		
Unterricht nach dem Rahmenlehrplan der SEK I. Ziel: ein der Berufsbildungsreife im Land Brandenburg entsprechender Abschluss					

Schule mit dem sonderpädagogischen  
Förderschwerpunkt Lernen  
Städtische Ganztagschule

## Schule am Nuthetal

# Psychomotorik



Schule mit dem sonderpädagogischen  
Förderschwerpunkt Lernen  
Städtische Ganztagschule


## Schule am Nuthetal

## Ganzttag



Schule mit dem sonderpädagogischen  
Förderschwerpunkt Lernen  
Städtische Ganztagschule

# Schule am Nuthetal

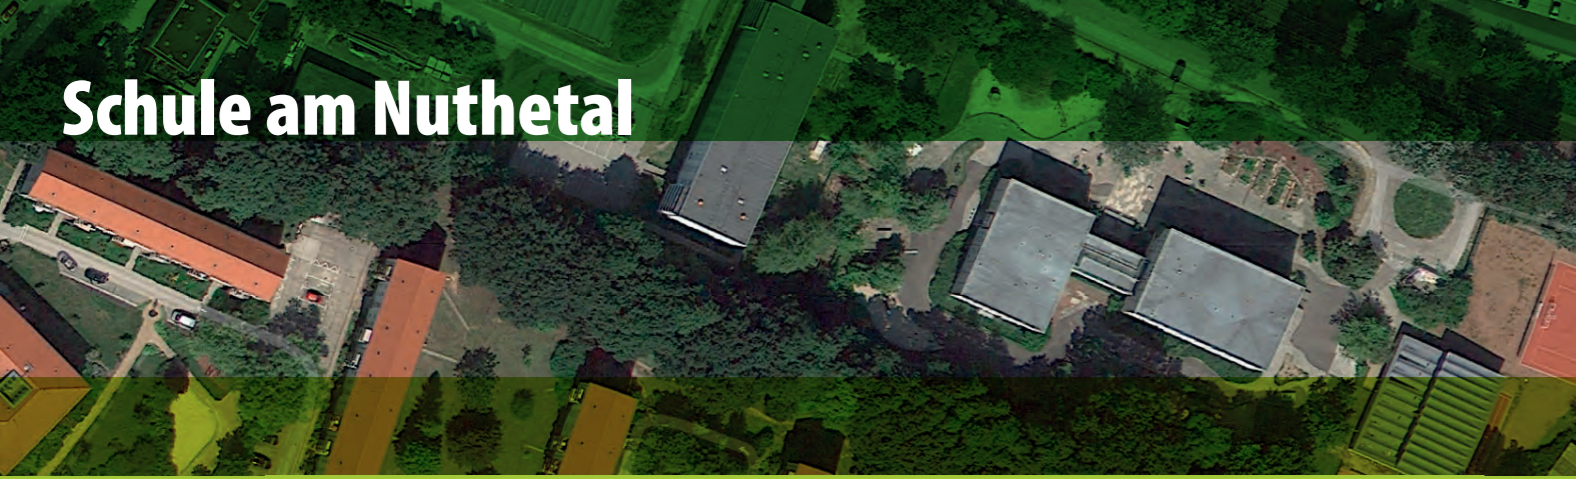

# Ganzttag





Schule mit dem sonderpädagogischen  
Förderschwerpunkt Lernen  
Städtische Ganztagschule

## Schule am Nuthetal

Ganzttag



Schule mit dem sonderpädagogischen  
Förderschwerpunkt Lernen  
Städtische Ganztagschule

## Schule am Nuthetal



„Starke Schule“




# 2011



## Wir sind eine „Starke Schule“

[www.starkeschule.de](http://www.starkeschule.de)




NETZWERK ZUKUNFT  
Schule + Wirtschaft für Brandenburg



### SCHULE MIT HERVORRAGENDER BERUFSORIENTIERUNG

2013-2017

Investition in Ihre Zukunft




# 2015



## Wir sind eine „Starke Schule“

[www.starkeschule.de](http://www.starkeschule.de)



## Schule am Nuthetal



## Kooperationspartner



Kooperationspartner	Kooperationsbereich	Inhalt
TÜV Rheinland Akademie	Berufsorientierung/ -vorbereitung	Durchführung Potenzialanalyse und Erprobungsphase in unterschiedlichen Berufsfeldern Berufsinfotag
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten/ Schirrhof	Berufsorientierung/ -vorbereitung	Kennenlernen verschiedener Berufsfelder im Rahmen des Praxislertags
Arbeitsagentur Potsdam/ Reha-Abteilung	Berufsberatung/ -orientierung	Wettbewerb:Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen Austausch der Schulen untereinander stärken, so dass die Qualität der pädagogischen Arbeit vor allem im Bereich „Übergang Schule-Beruf“ gesteigert werden kann.
DGB-Jugend	Bewerbungstraining	Projekte zum Bewerbungsverfahren
AOK Berlin-Brandenburg	Bewerbungstraining	Projekte zum Bewerbungsverfahren
Rückenwind e.V.	Berufsinformation	Projekt „Ein Jurist geht an die Schule“ Rechte und Pflichten als Auszubildender
Urania Schulhaus Jugendagentur	Berufsorientierung/ -vorbereitung Bewerbungstraining Lern- und Kompetenztraining Mitgestaltung des offenen Mittagsangebotes	Berufsbüro, Betriebsbesichtigungen, LKT-Modul „Ämterführerschein“, Stärken stärken Projekt „Start up“ Berufsinfotag
AWO Eltern-Kind-Zentrum „Spirelli-Bande“	Jugend- und Sozialarbeit	Kostenloses Angebot eines gesunden Frühstücks

Schule mit dem sonderpädagogischen  
Förderschwerpunkt Lernen  
Städtische Ganztagschule

## Schule am Nuthetal



## Kooperationspartner



Büro Blau – Beratung und Planung für Stadt und Landschaft	Berufsorientierung/-vorbereitung	Berufsbüro, Betriebsbesichtigungen, LKT-Modul „Ämterführerschein“, Stärken stärken Projekt „Start up“ Berufsinfortag
OSZ Technik Potsdam	Berufsorientierung/-vorbereitung	Besichtigung Vorstellen des schulischen Teils der dualen Ausbildung Praxislernetage für interessierte Schüler in unterschiedlichen Berufsfeldern Berufsinfortag
IHK Potsdam	Berufsorientierung/-vorbereitung	Berufsinfortag Bewerbungstraining Zukunftstag
Schule und Wirtschaft Netzwerk Zukunft	Berufsorientierung/-vorbereitung	Berufswahlpass Berufsinfortag
Stadtjugendring Potsdam	Berufsorientierung Jugendarbeit	Projekt „Beteiligung macht Schule“ Informationsworkshops für 8. bis 10. Klassen zu folgenden Themen: Jugendbeteiligung Wahlen ab 16 Berufsinfortag zum FÖJ/FSJ
Paragraph 13 e.V.	Schulsozialarbeit	Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung im Bereich Sozialarbeit in und im Umfeld von Potsdamer Schulen
Bürgerhaus am Schlaatz – Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam (KUBUS)	Jugend- und Sozialarbeit	Nutzung von Angeboten unter inklusiven Aspekten im unmittelbaren Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler Unterstützung bei den Projekten
Reiterhof Geltow / Potsdamer Reitverein	Ganztag	Unterstützung beim schulformübergreifenden Projekt „Pferde verbinden“ Unterstützung der Schülerpersönlichkeitsentwicklung zur Förderung von lernbehinderten, sinnesgeschädigten, verhaltensauffälligen und geistigbehinderten Kindern und Jugendlichen
Hoffbauerstiftung gGmbH – Jugendhaus „Oase“	Ganztag	Stiftung stellt Stellplätze und eine Bootswerkstatt zur Verfügung, die im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Bootsbau und Kanutouristik genutzt werden.

Schule mit dem sonderpädagogischen  
Förderschwerpunkt Lernen  
Städtische Ganztagschule

## Schule am Nuthetal



## Kooperationspartner



Karin Ranft	Ganztag	Ganztagsangebot
Steffen Dietel	Ganztag	Ganztagsangebot
Ralph Blankenburg	Ganztag	Ganztagsangebot
Ralph Baiert	Ganztag	Ganztagsangebot
Stefan Lude	Ganztag	Ganztagsangebot
STIBB e.V. – Sozial- Therapeutisches Institut Berlin-Brandenburg	Kinder- und Jugendarbeit	Projekt „Gewaltfreies Leben lernen“ für Schüler und Schülerinnen der Potsdamer Schulen
Potsdamer Betreuungshilfeverein	Ganztag	Projekte zum sozialen Lernen Beratungstätigkeit
Friedrich-Reinsch-Haus	Kinder- und Jugendarbeit Umweltlernen	Projekte zum Umgang mit Natur und Energie
AWO-Hort „Nuthegeister“	Kinder- und Jugendarbeit	Hortbetreuung
Wirtschaftsjunioren	Berufsorientierung	Bewerbungstraining
Handwerkskammer Potsdam	Berufsorientierung	Teilnahme am Berufsinfortag
Universität Potsdam - Humanwissenschaftliche Fakultät Arbeitsbereich Professur Sonderpädago- gische Kompetenzen in der Lehrerbildung	Lehrerbildung	Praktikum für jährlich ca. 20 Lehramtsstudierende
LALEB - Landesinstitut für Lehrerbildung des Landes Brandenburg	Lehrerbildung	Ausbildung zur Befähigung für ein Lehramt (1. und 2. Phase)
Oberstufenzentrum Johanna-Just	Erzieherausbildung	Praktika für Erzieher, Sozialassistenten Austausch und Zusammenarbeit im Fachbereich Soziales
Hoffbauerstiftung Hermannswerder	Erzieherausbildung	Praktika für Erzieher, Sozialassistenten Austausch und Zusammenarbeit im Fachbereich Soziales
Revierpolizei	Kinder- und Jugendarbeit	Projekte zur Sucht- und Gewaltprävention

## Schule am Nuthetal

Danke für die  
Aufmerksamkeit ...



Abrechnung der Veranstaltungen - MBS-Arena 2015

Termin	Veranstaltung	Veranstalter	Besucher	verkaufte Eintrittskarten	Nutzungsgebühr	Bemerkung	Kosten Sicherheit	Kosten Brandwache	Kosten Reinigung	Kosten Personal	Defizit aus Veranstaltungen	Stunden	
03.01.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	850	513	315,73 €	10 % vom Kartenv.	- 863,94 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.138,21 €	12	I. Quartal 2015
10.01.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	715	392	220,03 €	10 % vom Kartenv.	- 971,94 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.341,91 €	12	
11.01.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	1088	367	224,00 €	10 % vom Kartenv.	- 1.092,47 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 1.378,47 €	8	
17.01.2015	Potsdamer Hallenmasters	Brdg. Sportclub Süd 05 e.V.	- / -	- / -	1.776,00 €	12 Std. x 148,00 €	- 883,69 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	302,31 €	12	
18.01.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	637	347	198,32 €	10 % vom Kartenv.	- 1.147,70 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.539,38 €	12	
23.01.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	805	181	117,30 €	10 % vom Kartenv.	- 873,76 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 1.266,46 €	8	
28.01.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	577	256	151,71 €	10 % vom Kartenv.	- 863,94 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.302,23 €	12	
31.01. - 01.02.15	Turbine Hallencup	1. FFC Turbine	697	697	1.416,23 €	10 % vom Kartenv.	- 9.432,23 €	- 563,20 €	- 700,00 €	- 480,00 €	- 9.759,20 €	24	
03.02.2015	Internat. Kugelstoßmeeting	SC Potsdam	970	394	304,06 €	10 % vom Kartenv.	- 1.291,01 €	- 268,80 €	- 350,00 €	- 340,00 €	- 1.945,75 €	17	
07.02.2015	E-Junioren Cup	SV Babelsberg 03	68	68	12,30 €	10 % vom Kartenv.	- 1.129,01 €	- €	- 350,00 €	- 320,00 €	- 1.786,71 €	16	
14.02.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	743	196	116,10 €	10 % vom Kartenv.	- 873,76 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 1.267,66 €	8	
15.02.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	984	571	328,15 €	10 % vom Kartenv.	- 1.288,87 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.550,72 €	12	
20.02.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	687	161	95,70 €	10 % vom Kartenv.	- 863,94 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 1.278,24 €	8	
21.02.2015	Cheerleadingmeisterschaft	American Football Verband	- / -	- / -	2.220,00 €	15 Std. x 148,00 €	- 5.350,54 €	- 614,40 €	- 350,00 €	- 300,00 €	- 4.394,94 €	15	
08.03.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	712	184	106,80 €	10 % vom Kartenv.	- 1.092,47 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 1.495,67 €	8	
21.03.2015	Playoff Spiel	SC Potsdam	1052	711	404,76 €	10 % vom Kartenv.	- 962,12 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.147,36 €	12	
27.03.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	938	352	211,40 €	10 % vom Kartenv.	- 863,94 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 1.162,54 €	8	
11.04.2015	Aufstiegssturnier Regionalliga	SC Potsdam	- / -	- / -	- €	kein Kartenverkauf	- 706,86 €	- €	- €	- 240,00 €	- 946,86 €	12	II. Quartal 2015
18.04.2015	Nordostd. Meisterschaften Jugend SCP	SC Potsdam	- / -	- / -	- €	kein Kartenverkauf	- 903,21 €	- €	- €	- 240,00 €	- 1.143,21 €	12	
21.04.2015	Sponsoren Kochen	SC Potsdam	- / -	- / -	320,00 €	10 % vom Kartenv.	- €	- 320,00 €	- €	- 80,00 €	- 80,00 €	4	
25.04.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	544	253	132,30 €	10 % vom Kartenv.	- 863,94 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 1.241,64 €	8	
27.04.2015	Mitarbeiter-Sportveranstaltung	Deka Bank	- / -	- / -	120,00 €	2 Std. x 60,00 €	- €	- €	- €	- 20,00 €	100,00 €	2	
01.05.2015	Fan- u.Familienfest & Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	1168	666	333,50 €	10 % vom Kartenv.	- 1.840,79 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 2.017,29 €	8	III. Quartal 2015
16.05.2015	Bundesligakampf UJKC	UJKC Potsdam	263	263	184,74 €	10 % vom Kartenv.	- 932,66 €	- €	- 350,00 €	- 120,00 €	- 1.217,92 €	6	
30.05.2015	Bundesligakampf UJKC	UJKC Potsdam	198	198	141,29 €	10 % vom Kartenv.	- 785,40 €	- €	- 350,00 €	- 80,00 €	- 1.074,11 €	4	
31.05.2015	D-Jugend 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	200	0	- €	kein Kartenverkauf	- 883,79 €	- €	- 350,00 €	- 200,00 €	- 1.433,79 €	10	
04.07.2015	Bundesligakampf UJKC	UJKC Potsdam	150	128	88,88 €	10 % vom Kartenv.	- 706,86 €	- €	- 350,00 €	- 80,00 €	- 1.047,98 €	4	
01.09.2015	Eröffnungsspiel 1. VfL	1. VfL Potsdam	1436	1092	673,00 €	10 % vom Kartenv.	- 1.138,83 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 975,83 €	8	IV. Quartal 2015
05.09.2015	Bundesligakampf UJKC	UJKC Potsdam	186	186	127,16 €	10 % vom Kartenv.	- 785,40 €	- €	- 350,00 €	- 120,00 €	- 1.128,24 €	6	
06.09.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	438	250	179,50 €	10 % vom Kartenv.	- 1.080,19 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 1.410,69 €	8	
18.09.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	534	243	169,20 €	10 % vom Kartenv.	- 549,78 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 890,58 €	8	
25.09.-27.09.15	Volleyball-Masters SCP	SC Potsdam	572	370	105,29 €	10 % vom Kartenv.	- 2.299,89 €	- €	- 1.050,00 €	- 700,00 €	- 3.944,60 €	35	
09.10.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	626	304	350,30 €	10 % vom Kartenv.	- 549,78 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 709,48 €	8	IV. Quartal 2015
21.10.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	712	491	291,84 €	10 % vom Kartenv.	- 863,94 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.162,10 €	12	
23.10.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	740	355	288,90 €	10 % vom Kartenv.	- 549,78 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 770,88 €	8	
31.10.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	581	353	218,59 €	10 % vom Kartenv.	- 1.487,36 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.858,77 €	12	
04.11.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	296	135	79,32 €	10 % vom Kartenv.	- 1.079,93 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.590,61 €	12	
14.11.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	644	325	225,10 €	10 % vom Kartenv.	- 549,78 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 834,68 €	8	
15.11.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	537	314	188,02 €	10 % vom Kartenv.	- 1.202,94 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.604,92 €	12	
21.11.2015	Bläserklassentreffen	VDMK Potsdam	1600	- / -	1.500,00 €	Nutzungsgebühr	- 893,39 €	- €	- 350,00 €	- 140,00 €	116,61 €	7	
27.11.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	745	412	293,50 €	10 % vom Kartenv.	- 549,78 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 766,28 €	8	
28.11.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	629	392	239,00 €	10 % vom Kartenv.	- 1.040,66 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.391,66 €	12	
04.12.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	382	257	255,30 €	10 % vom Kartenv.	- 549,78 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 804,48 €	8	
12.12.-13.12.15	Final four Handball	Handballverband Brdbg.	970	- / -	5.190,00 €	Nutzungsgebühr	- €	- €	- 700,00 €	- 400,00 €	4.090,00 €	20	
19.12.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	718	357	220,58 €	10 % vom Kartenv.	- 785,40 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.154,82 €	12	
20.12.2015	Punktspiel 1. VfL Potsdam	1. VfL Potsdam	607	312	203,70 €	10 % vom Kartenv.	- 687,39 €	- €	- 350,00 €	- 160,00 €	- 993,69 €	8	
22.12.2015	Punktspiel SC Potsdam	SC Potsdam	693	373	210,48 €	10 % vom Kartenv.	- 937,58 €	- €	- 350,00 €	- 240,00 €	- 1.317,10 €	12	
					20.548,08 €		- 55.050,42 €	- 1.766,40 €	- 16.450,00 €	- 9.940,00 €	- 62.658,74 €		

Die ausgewiesenen Kosten beinhalten einen Teil der veranstaltungsbezogenen Kosten in der MBS-Arena. Veranstaltungsbezogene Betriebskosten (Strom, Wasser, Abwasser, Heizung etc. und weitere Kostenarten) sind hier nicht berücksichtigt.



**Kommunaler Immobilien Service (KIS)**  
**Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

# **Fortschrittsbericht**

# **Baumaßnahmen an Schulen**

Stand: Juni 2016

---



## Humboldt-Gymnasium (1)

Sanierung, Erweiterung und Neugestaltung Außen- und Sportanlagen

### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Neubau	100	100	100	100	100	100	100	100
Altbau	100	100	100	100	100	80	80	35

### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Neubau	Okt. 13	Jul. 15	Schuljahr 15/16
Altbau	Sept. 15	Dez. 16	Jan. 17

### Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Neubau	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>
Altbau	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>

### Bemerkung

Neben Schwammbefall Decke DG und Dachtragwerk nunmehr auch Feststellung, dass Putz und Deckenbestand schlechter, als bei Probeöffnungen festgestellt. In Abstimmung mit Schulleitung nur schrittweiser Abbruch; --->Fertigstellung Ende 2016.





## Helmholtz-Gymnasium (4)

Sanierung und Erweiterung



### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	90

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Jul. 13	Aug. 16	Sept. 16

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung



# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Eisenhart-Grundschule (24)

Sanierung Filiale

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	99

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Aug. 14	Aug. 15	05.09.2016

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung

Rückzug Eisenhart-Grundschule und Hort in Sommerferien 2016



## Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)

Außenanlagen (2. BA)



### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	98

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Nov. 15	Mai 16	01.06.2016

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung

Nutzungsübergabe am 10.06.2016 erfolgt,  
Schulgarten wegen Restleistungen am 20.06.2016



### Standort Goetheschule (21/31)

#### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Goethe- & Beethovenhaus	100	100	100	100	100	100	100	100
Aula	100	100	100	80	0	0	0	0

#### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Goethe- & Beethovenhaus	Jun. 13	Jul. 15	in Nutzung
Aula	Jul. 16	Dez. 16	Jan. 17

#### Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Goethe- & Beethovenhaus	●	●
Aula	●	●

#### Bemerkung





## Zeppelin-Grundschule (23)

Ausbau Untergeschoss

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	80	30

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 16	Sept. 16	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung



## Friedrich-Wilhelm-v.-Steuben Gesamtschule (46)

Brandschutzsanierung

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	15	0	0	0	0	0	0


### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Aug. 16	Dez. 16	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung





## Grundschule Am Kirchsteigfeld (56)

Brandschutzsanierung

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	15	0	0	0	0	0	0


### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Aug. 16	Dez. 16	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung





## Gesamtschule Leonardo da Vinci (32)

Neubau Gesamtschule im Potsdamer Norden



### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	98	97	97	75

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Nov. 14	offen	offen

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung

Auf Grund Feuchteproblematik Ausgleichsestrich mussten Arbeiten im Schulgebäude weitestgehend eingestellt werden. Schadensbeseitigung wird untersucht und geplant. Voraussichtlich liegt Konzeption ab 20/21 KW vor. Eröffnung muss verschoben werden. Turnhalle nicht betroffen.





## Schulstandort Gagarinstraße (GES29)

Gesamtschule mit Primarstufe und Hort und Errichtung 4-Feld-Sporthalle

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	80	40	0	0	0	0


### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Sept. 16	Jun. 18	Schuljahr 18/19

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung





# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

## Grundschule Bornim

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	80	40	0	0	0	0


### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Sept. 16	Jun. 18	Schuljahr 18/19

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung





## Grundschule Bornstedter Feld

Neubau 3-zügige Grundschule mit Hort und Turnhalle

### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Schule	100	0	0	0	0	0	0	0

### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Schule	2017	2019/2020	2019/2020

### Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Schule		

### Bemerkung

Teilnehmer des Architekturwettbewerbs stehen fest.



## Turnhalle Kurfürstenstraße

Neubau

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	95	95	70


### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 15	Herbst 2016	Herbst 2016

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung





# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

## Turnhalle Leibniz-Gymnasium (41)

Sanierung und Erweiterung

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	95	80	50	50	5



### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 16	Sommer 17	Sommer 17

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

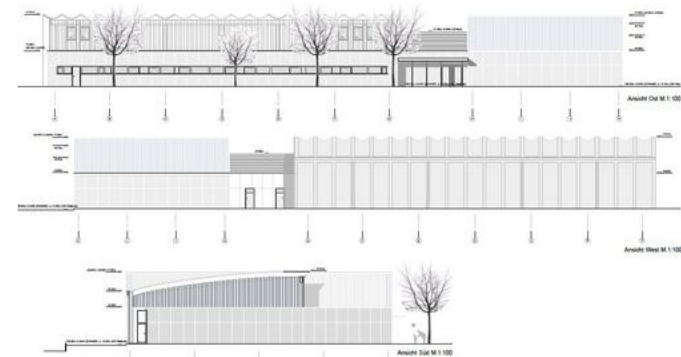



## Turnhalle Ludwig-Renn-Grundschule (2)

Neubau

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	50	0	0	0	0	0	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Frühjahr 18	Frühjahr 18

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung



## Motorsporthalle (21)

Sanierung

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	90	30	5	0	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mai 16	Herbst 18	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Schulsport wird gewährleistet, temporäre Einschränkungen.



## Sporthalle Heinrich-Mann-Allee

Brandschutzsanierung



### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	70	0	0	0	0	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
offen	offen	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung

Projekt wurde vorläufig bis zur Entscheidung über Grundschulstandort zurückgestellt.



## Schilfhofschule (49)

Sanierung und Erweiterung



### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	90	55	20	20	5

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 16	Aug. 17	Schuljahr 17/18

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung

Fertigstellung Mitteltrakt Aug. 2017, Längsriegel Ende 2017



### Temp. Schule in Modulbauweise Humboldttring (37)

Neubau



#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
40	30	0	0	0	0	0	0

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Aug. 16	Sommer 17	Sommer 17

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

#### Bemerkung



## Aufnahmen der weiterführenden Schulen Potsdam

Stand: 22.06.2016

Schulname	Kapazität	Integrationsk lassen	Aufnahme im Erstwunsch	Aufnahme im Zweitwunsch	SOP (vorabnahme)	Wiederholer	Aufnahmen/Zuweisungen durch Schulamt
Berufsvorbereitende Oberschule Pierre de Coubertin	46	2	16	4	9	1	16
Montessori-Oberschule mit Primarstufe	46	2	38	3	5	0	0
Käthe-Kollwitz-Oberschule	50	1	12	9	4	2	23
Oberschule "Theodor Fontane" mit Primarstufe	46	2	21	2	8	3	12
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben- Gesamtschule	130	2	72	40	8	10	0
Voltaire-Gesamtschule	98	1	80	11	4	3	0
Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule	102	2	75	17	8	2	0
Gesamtschule am Schilfhof	102	2	57	30	7	8	0
Gesamtschule "Peter Joseph Lenné"	107	1	94	7	5	1	0
Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn"	5 Spezialklass						0
Humboldt-Gymnasium	84		84	0	0	0	0
Hermann-von-Helmholtz- Gymnasium Europaschule	84		77	5	2		0
Leibniz-Gymnasium	112		61	29			22
Einstein-Gymnasium Potsdam	112		88	20		4	0
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg	84		67	16	1		0
Gymnasium Potsdam West (Haeckelstr.)	84		14	6			64
